

# Evaluierungsergebnisse – auf einen Blick

## Tunesien



|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekttitel</b>         | Kompetenzentwicklung zur Qualitätssicherung für den Export II                                                                            |
| <b>BMZ-Projektnummer</b>    | 2019.2110.5                                                                                                                              |
| <b>Sektor-/CRS-Code</b>     | 33110 Handelspolitik und -verwaltung                                                                                                     |
| <b>Auftraggeber</b>         | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)                                                               |
| <b>Politischer Träger</b>   | Ministerium für Industrie, Bergbau und Energie                                                                                           |
| <b>Umsetzungspartner</b>    | Ministerium für Industrie, Bergbau und Energie und andere Ministerien, Institutionen der Qualitätsinfrastruktur und Privatsektorverbände |
| <b>Projektvolumen</b>       | 2 Mio. EUR                                                                                                                               |
| <b>Projektlaufzeit</b>      | 01.08.2020 – 31.01.2024                                                                                                                  |
| <b>Evaluierungszeitraum</b> | 05.2023                                                                                                                                  |

### Kurzbeschreibung und Ziele des Vorhabens


Das Ziel auf Outcome-Ebene war, dass Unternehmen bedarfsgerechte QI-Dienstleistungen und Personal für den Export in die EU zur Verfügung stehen. Output 1 förderte die Erarbeitung von technischen Vorschriften. In Output 2 wurden QI-Institutionen gestärkt. Output 3 befasste sich mit Metrologie in der universitären und beruflichen Bildung. Output 4 förderte Kompetenzen in Unternehmen. Die Konzeption wurde Großteils wie geplant umgesetzt.

### Wichtige Ergebnisse

Das Modulziel wird zum überwiegenden Teil erreicht. Kompetente Projektdurchführung und Ownership der Partner trugen entscheidend dazu bei.

- Das Projekt ist wegen seiner Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eindeutig relevant.
- Die Kohärenz wurde über enge Abstimmung mit EU und innerhalb der PTB erfolgreich gewahrt.
- Eine beeindruckende Anzahl an Aktivitäten wurde durchgeführt, zu meist mit sehr guten Ergebnissen.
- Das Vorhaben war effizient, da es mit begrenzten Mitteln trotz Verzögerungen viel erreichte.
- Es gibt deutliche Verbesserungen bei QI-Dienstleistungen und qualifiziertem Personal. (Politische) Fragen zum nationalen Messwesen bleiben ungelöst.
- Die meisten Partner verfügen über den Willen und die Kapazitäten, um Nachhaltigkeit zu sichern. Risiken liegen in politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.

### Gesamtbewertung: Erfolgreich (1,6)

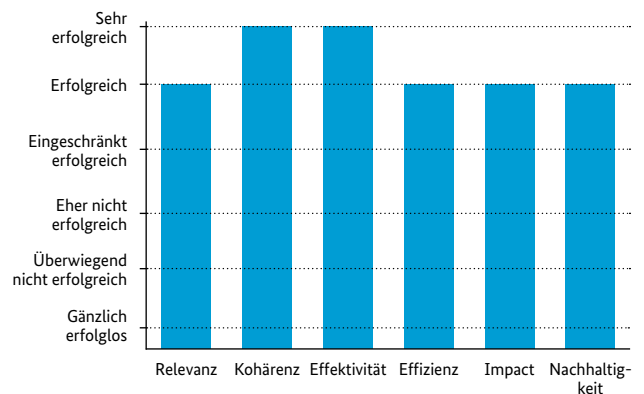

### Schlussfolgerungen

- Output 4 war so konzipiert, dass seine Umsetzung von einer Wirkungsstudie (randomisierte, kontrollierte Studie) begleitet wurde. In diesem innovativen und intensiven Prozess wurden wertvolle Erfahrungen zur Vereinbarkeit der Projektdurchführung mit den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Studie gewonnen, die innerhalb der PTB und deutschen EZ geteilt werden können.
- Das Projekt war breit aufgestellt. Eine Reduktion der Interventionsbereiche, z.B. durch stärkere Fokussierung auf QI-Institutionen, hätte die Komplexität der Projektdurchführung verringern können.
